

令和3年度 第2回柳が崎ヨットハーバー利用者連絡会 次第

日時：令和3年11月14日（日）

場所：県立柳が崎ヨットハーバー内

国体記念艇庫 2F 会議室

1. あいさつ

県立柳が崎ヨットハーバー 支配人 安藤 清代

2. 内 容

○ヨットハーバー艇庫棟の長寿命化工事の工期及び概要について

①工期について

H8 9A 開設

長寿命化 通常予算とは別

②足場設置等による利用制限について

1F 艇庫利用における留意点（庇・軒天改修含む）

屋上駐車場の利用制限 11~12月

3F 駐車場の利用制限 1月

車路スロープの片側通行について

③2階艇庫利用者への利用制限について

2F リフター前ヨット搬出入口の防水工事について

④外部階段の改修工事について

⑤今年度内で実施するその他工事について

男女トイレ便器ウォシュレットへの全面改修

→ 国のコロナ予算 2月後半

屋外仮置き艇バース設置

⑥実施済み工事

屋外灯（4基）撤去

手洗い場屋根解体

・その他県への要望事項

県道への南出入口の拡幅

南側棧橋係留杭撤去及び設置

北側棧橋堆積砂掘削

①事務所前、アンケート調査あり → 是非書いて欲しい
(満足度調査)

3. その他 ②漏水対策 皆で協力！ 掃除に協力！

③艇を洗う際、洗剤を湖に流さない → 下水に流すこと
ように

4. 閉会あいさつ 県立柳が崎ヨットハーバー 支配人 安藤 清代

夏の 925万円 15F 2025/3月に竣工


レスキューボート用 固定アンカーを打つ予定


2022秋 琵琶湖インクル 開催


来年度中のハーバー工事はふんねし
予算要求もこれから

■ 工事工程表 (参考)

県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事

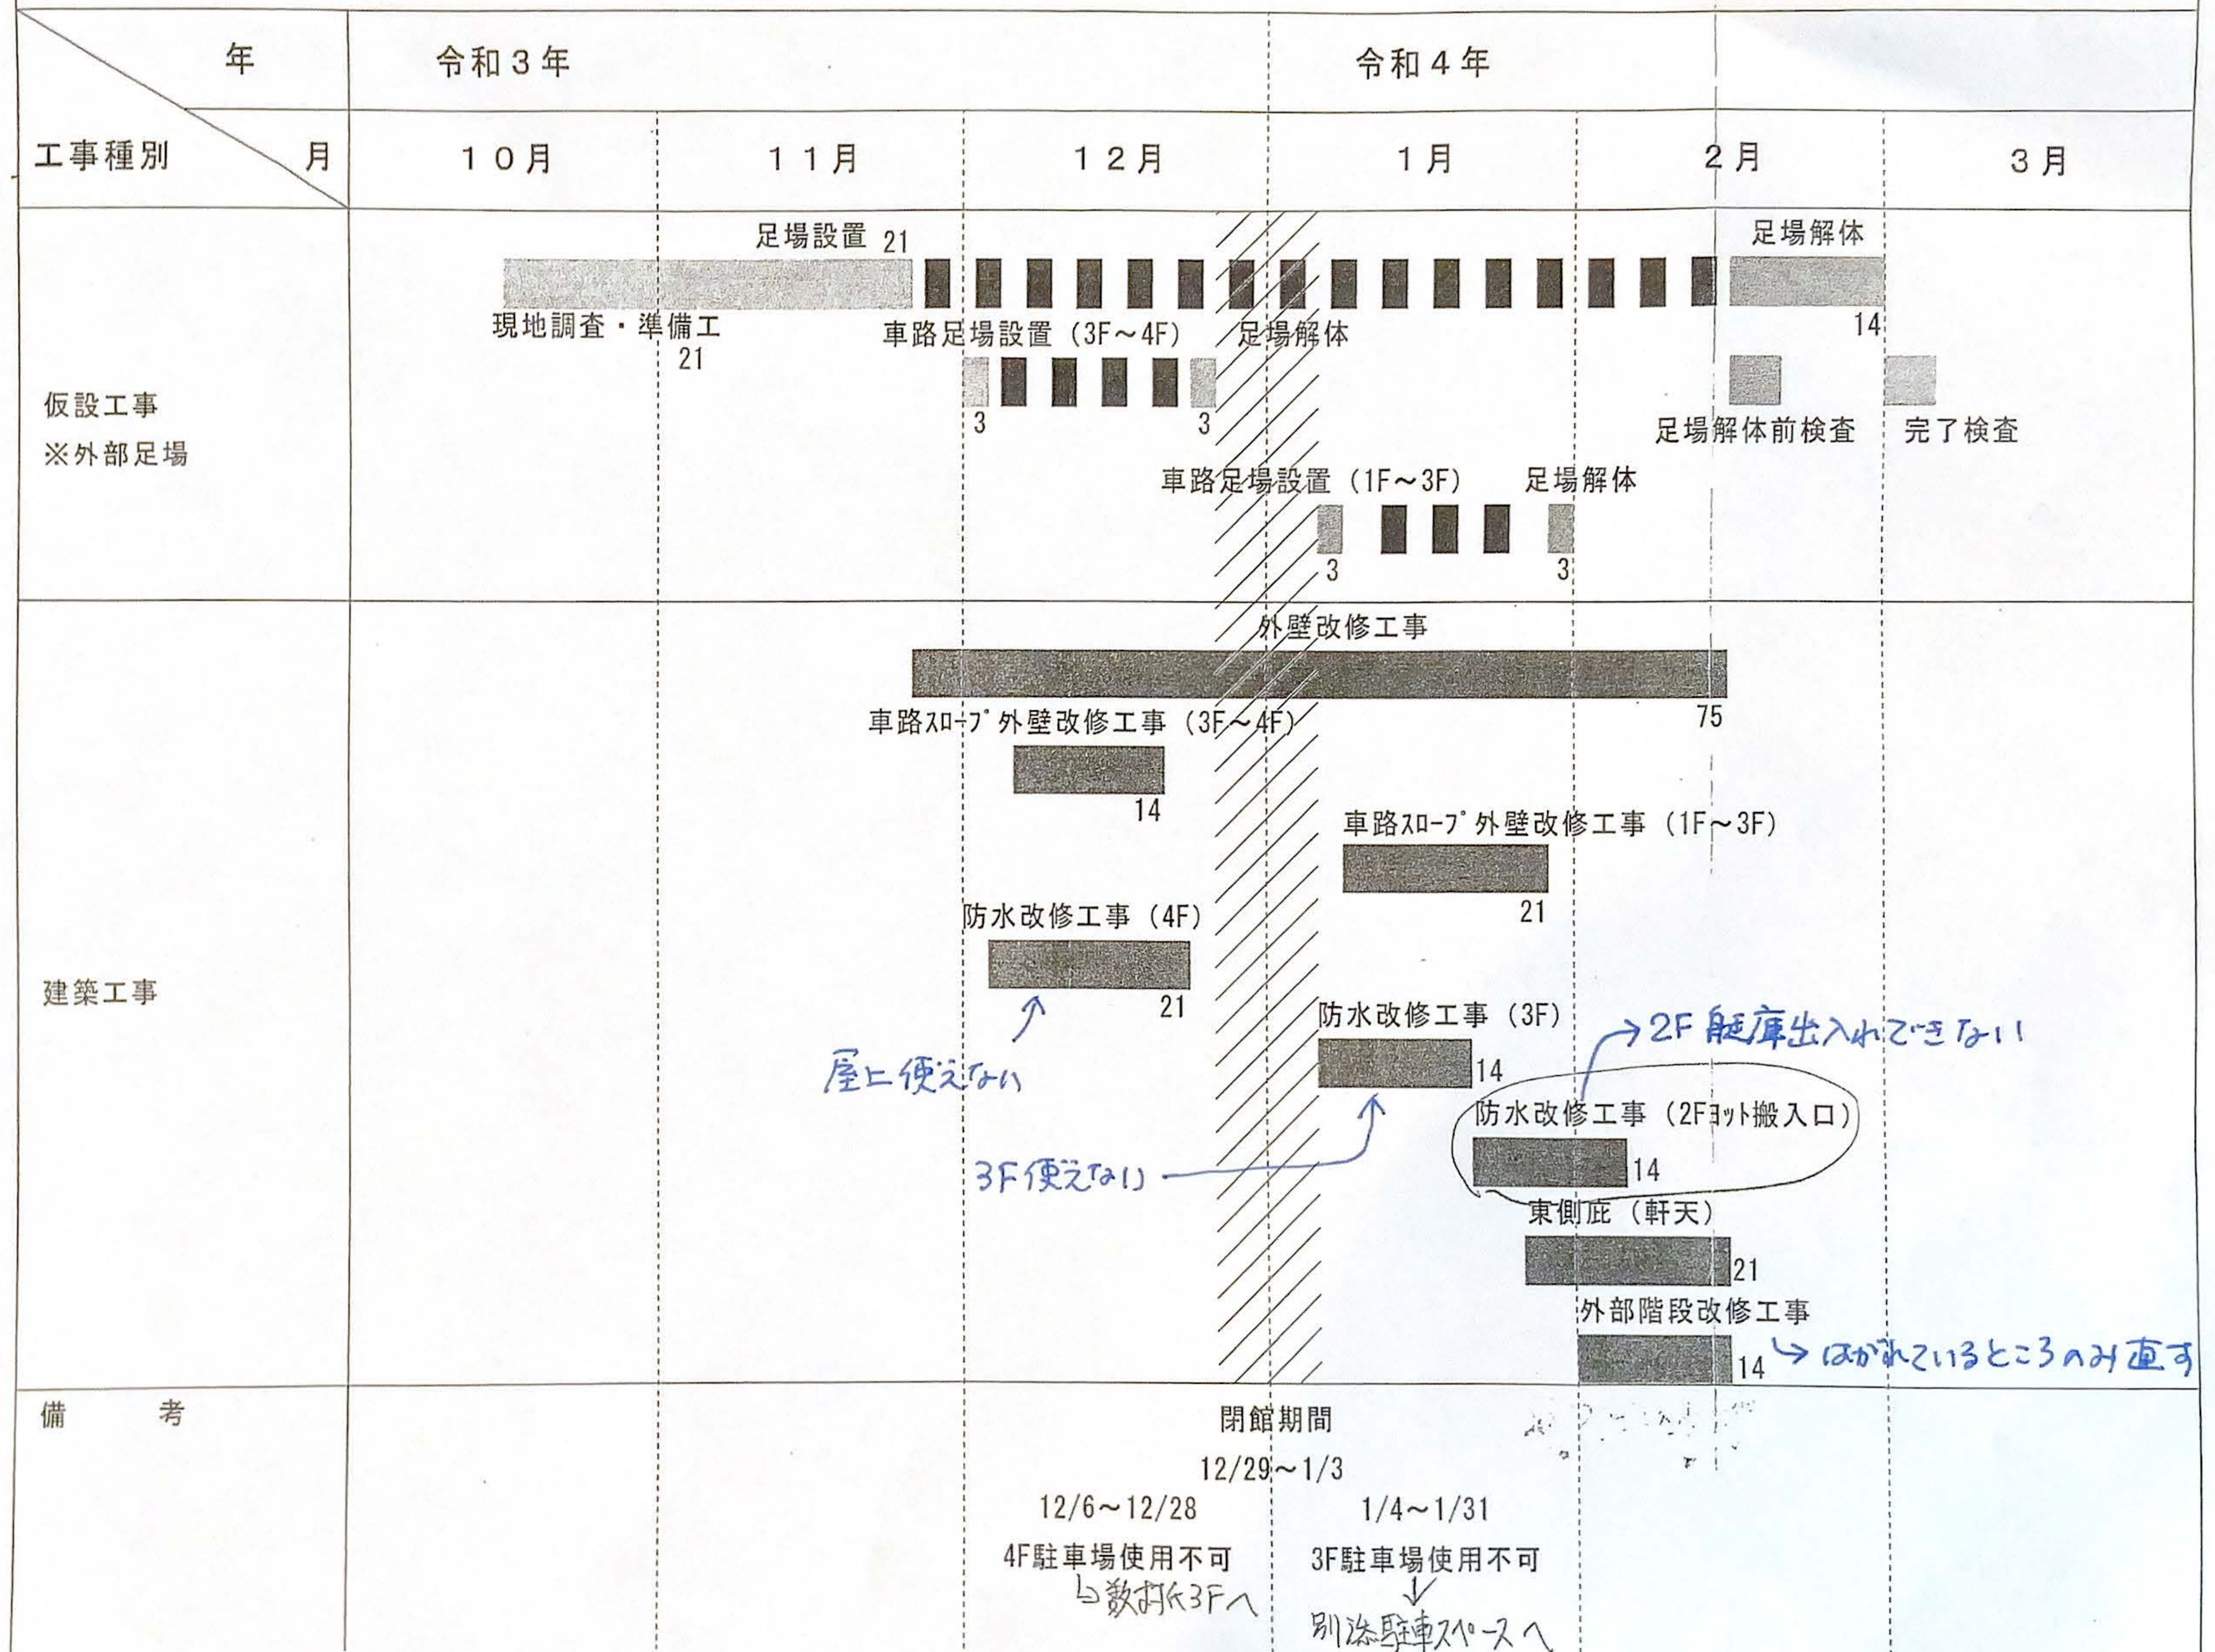

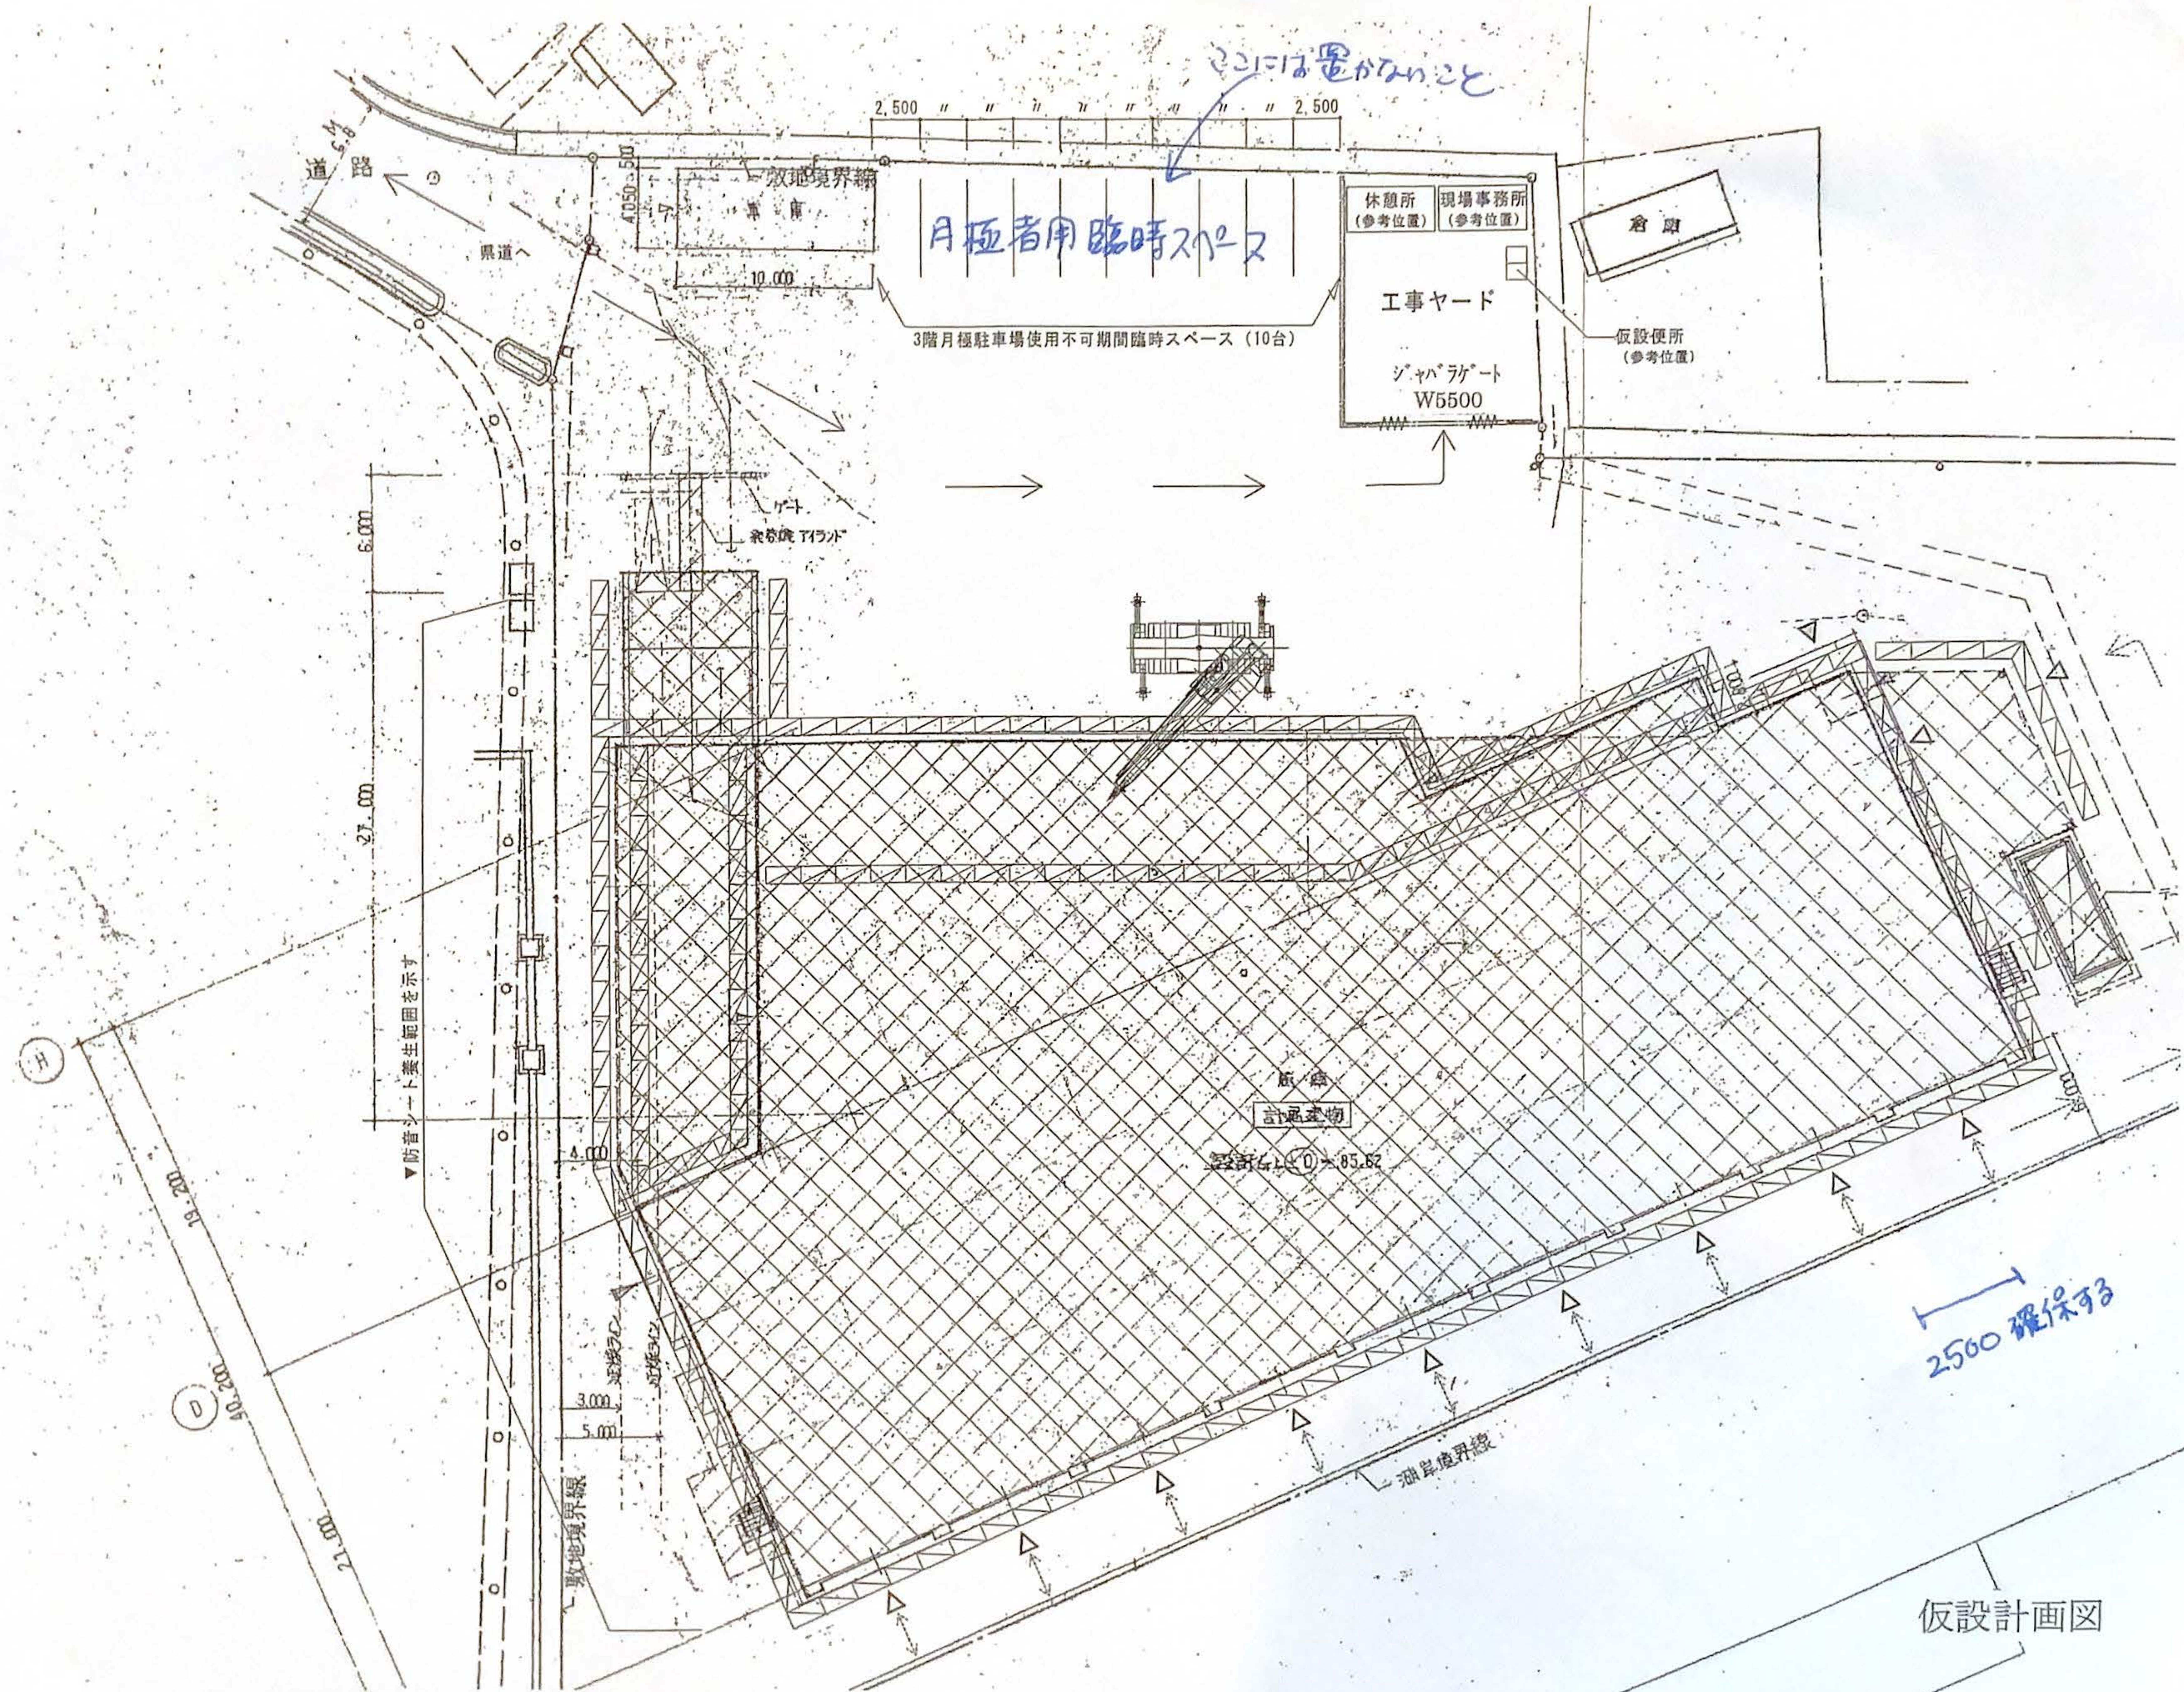



3 階仮設計画図

11月間工程表

工事名称 令和 3 年度 第 65 号 県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事															月間 工程	令和 3年 11月 1日から 令和 3年 11月 30日まで							週休2日促進型 実施・否 (土曜日・日曜日)				現場代理人 白井		主任技術者 白井				
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考
工 種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
準備・検査		準備				仮設電気・水道																											
共通仮設工事					仮設ハウス設置						外部仮囲設置																						
直接仮設工事																外部足場組(西・南)							外部足場組(東・北)					外部足場組					
外壁改修(仕上)																								東側底サポート支柱					クラック処理				
																							クラック事前調査						シール				
外壁改修(解体)					アスベスト事前調査																									アスベスト除去			
								床シート撤去(北階段)																東側底軒・笠木撤去									
防水改修(仕上)																																	
防水改修(解体)					アスベスト事前調査																									アスベスト除去			
								ストッパー撤去																						シンダーコン撤去			
金属・板金																																	
記 事		11/15よりR階駐車不可(1～3階車路一方通行)→																															
		現場閉所		第3回定例		現場閉所		現場閉所		第4回定例		現場閉所		現場閉所		第5回定例		現場閉所		現場閉所		第6回定例		現場閉所		現場閉所							

3F 車26台(か)駐車できない ~ 12月

12月間工程表

工 事 名 称															月 間 工 程	令和 3 年 12 月 1 日から 令和 3 年 12 月 31 日まで							週休2日促進型				現場代理人				主任技術者			
令和 3 年度 第 65 号 県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事																							実施・否 (土曜日・日曜日)				白井				白井			
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考	
工 種		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
準備・検査																																		
共通仮設工事																																		
直接仮設工事		外部足場組(東底上部)					ネット等仕舞																											
外壁改修(仕上)																																		
		クラック処理、シール打ち替え																																
			R階 樹脂Mo																															
外壁改修(解体)		アスベスト除去(西・南・東・北)																																
防水改修(仕上)																																		
防水改修(解体)		アスベスト除去																																
											シンダーコン撤去																							
											2・3階笠木撤去																							
金属・板金																											3～R階 ストッパー取付							
記 事		第7回定例 現場閉所 現場閉所 第8回定例 現場閉所 現場閉所 11月15日～12月28日 第9回定例 現場閉所 現場閉所 R階駐車場使用不可 第10回定例 現場閉所 現場閉所 現場閉所 現場閉所 現場閉所(閉館) 現場閉所(閉館) 現場閉所(閉館)																																

1 月 間 工 程 表

工事名称 令和 3 年度 第 65 号 県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事															月間 工程	令和 4年 1月 1日から 令和 4年 1月 31日まで							週休2日促進型 実施・否 (土曜日・日曜日)				現場代理人 白井				主任技術者 白井			
工 種	日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
準備・検査																												外壁検査(西側)						
共通仮設工事																																		
直接仮設工事																																		
								3F 駐車不可 (道路 片側通行)																										
外壁改修(仕上)						シール・塗装改修				(西・南・東・北)																								
																										サッシ清掃								
防水改修(仕上)						パラペット塗膜防水(西・南・東・北)																												
金属・板金																																		
記 事	現場閉所 (閉館)	現場閉所 (閉館)	現場閉所 (閉館)	現場閉所	現場閉所			現場閉所	現場閉所	1月4日～1月31日 3階駐車場使用不可										現場閉所	現場閉所		第13回定例	現場閉所	現場閉所									
										第11回定例		現場閉所	現場閉所	第12回定例		現場閉所	現場閉所																	

2 月 間 工 程 表

工事名称 令和 3 年度 第 65 号 県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事															月間 工程	令和 4 年 2 月 1 日から 令和 4 年 2 月 28 日まで							週休2日促進型				現場代理人		主任技術者			
																実施・否 (土曜日・日曜日)							白井		白井							
工種	日・曜日														15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		
準備・検査			外壁検査(北側)																		外壁検査(最終)											
共通仮設工事																										3階仮囲撤去						
直接仮設工事	足場撤去(東側)						足場撤去(北側)																									
外壁改修(仕上)	シーリング・塗装改修																															
					</																											

2F 艇庫使用不可 (リフト-使用可)

W 450 mm

W 1,820 mm

S=1/10 W450 H1820

W 180 mm

↑

片側交互通行

工事中止につき右側通行を止め、左側通行に協力ください

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー

× 4 枚

赤マーカー

赤文字

一般車両進入禁止

これより先工事関係車および見極め契約車以外

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー

× 1 枚

R3、11、8 (月) X-IL、FAX

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー 御中 ご担当 山本様 11月13日(土)納品予定

いつもお世話になり、有難うございます。レイアウトをお送りしますので校正をお願いいたします。

担当 西岡

(株)ニシオカ

TEL 077-522-2945(代)
FAX 077-523-5405
